

Nguyễn Quốc Yên


1150080164

Lớp 11cnpm2

I. Chuẩn bị dữ liệu (Excel để nhập vào MS Project)

II. Tạo kế hoạch trong Microsoft Project

File → New → Blank Project. Đặt Project Start Date (Project → Project Information) = 01/04/2025.

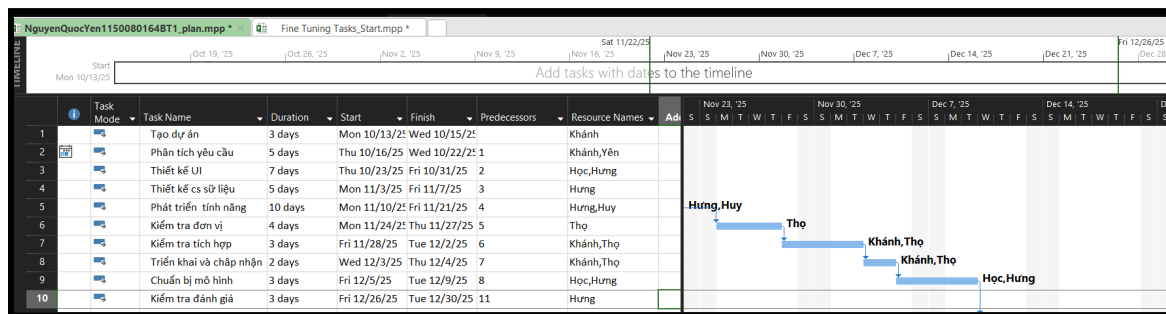

III. Kiểm tra sự quá tải tài nguyên và cân bằng (Resource Leveling)

A. Kiểm tra quá tải:

- View → Resource Sheet: nếu có biểu tượng người đỏ → tài nguyên bị quá tải.

The screenshot shows the Resource Sheet view. The top section lists resources with their names, types, and initial status. The bottom section shows the resource allocation for each task, with a red icon indicating overallocation.

Resource ID	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Code
1	Khánh	Work		K		100%	\$30.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
2	Yên	Work		Y		100%	\$25.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
3	Học	Work		H		100%	\$22.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
4	Hưng	Work		H		100%	\$28.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
5	Huy	Work		H		100%	\$26.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
6	Thọ	Work		T		100%	\$20.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
7	Khánh; Yên	Work		K		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
8	Học; Hưng	Work		H		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
9	Hưng; Huy	Work		H		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
10	Thọ; Khánh	Work		T		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	
11	Khánh; Thọ	Work		K		100%	\$0.00/hr	\$0.00/hr	\$0.00	Prorated	Standard	

(Hình không quá tải)

- View → Resource Usage: chọn tài nguyên bị đỏ để xem ngày/giờ vượt quá 8h/ngày.

B. Cân bằng thủ công:

- Dời lịch các task trùng ngày sang ngày kế tiếp (chuyển song song → tuần tự).
- Hoặc giảm Work/Duration từng task (ví dụ từ 8h → 4h trong các ngày trùng).
- Hoặc Split Task để phân chia khối lượng ra nhiều ngày.

C. Cân bằng tự động:


- Resource → Leveling Options → Level All → OK.

IV. Kiểm tra chi phí (Costs)

- View → Resource Usage: thêm cột Cost hoặc xem tổng ở cuối từng tài nguyên.

		Resource Name	Work	Cost	Ac	Details	S	Oct 26, '25	S	M	T	W	T	F	S
1		Khánh	144 hrs	\$4,320.00		Work				8h	8h	8h			
		Tạo dự án	56 hrs	\$1,680.00		Work									
		Phân tích yêu cầu	48 hrs	\$1,440.00		Work			8h	8h	8h				
		Kiểm tra tích hợp	24 hrs	\$720.00		Work									
		Triển khai và chờ	16 hrs	\$480.00		Work									
2		Yên	40 hrs	\$1,000.00		Work			8h	8h					
		Phân tích yêu cầu	40 hrs	\$1,000.00		Work			8h	8h					
3		Học	60 hrs	\$1,320.00		Work							8h	8h	
		Thiết kế UI	36 hrs	\$792.00		Work							8h	8h	
		Chuẩn bị mô hình	24 hrs	\$528.00		Work									
4		Hưng	204 hrs	\$5,712.00		Work							8h	8h	
		Thiết kế UI	36 hrs	\$1,008.00		Work							8h	8h	
		Thiết kế cs sử liệ	40 hrs	\$1,120.00		Work									
		Phát triển tính n	80 hrs	\$2,240.00		Work									
		Chuẩn bị mô hình	24 hrs	\$672.00		Work									
		Kiểm tra đánh gi	24 hrs	\$672.00		Work									
5		Huy	80 hrs	\$2,080.00		Work									
		Phát triển tính n	80 hrs	\$2,080.00		Work									
6		Thọ	72 hrs	\$1,440.00		Work									
		Kiểm tra đơn vị	32 hrs	\$640.00		Work									
		Kiểm tra tích hợp	24 hrs	\$480.00		Work									
		Triển khai và chờ	16 hrs	\$320.00		Work									
						Work									

- Report → Costs → Cost Overview (nếu không thấy, chọn More Reports... → tab Costs → Cost Overview).
- Report → Costs → Cash Flow để xem dòng tiền.

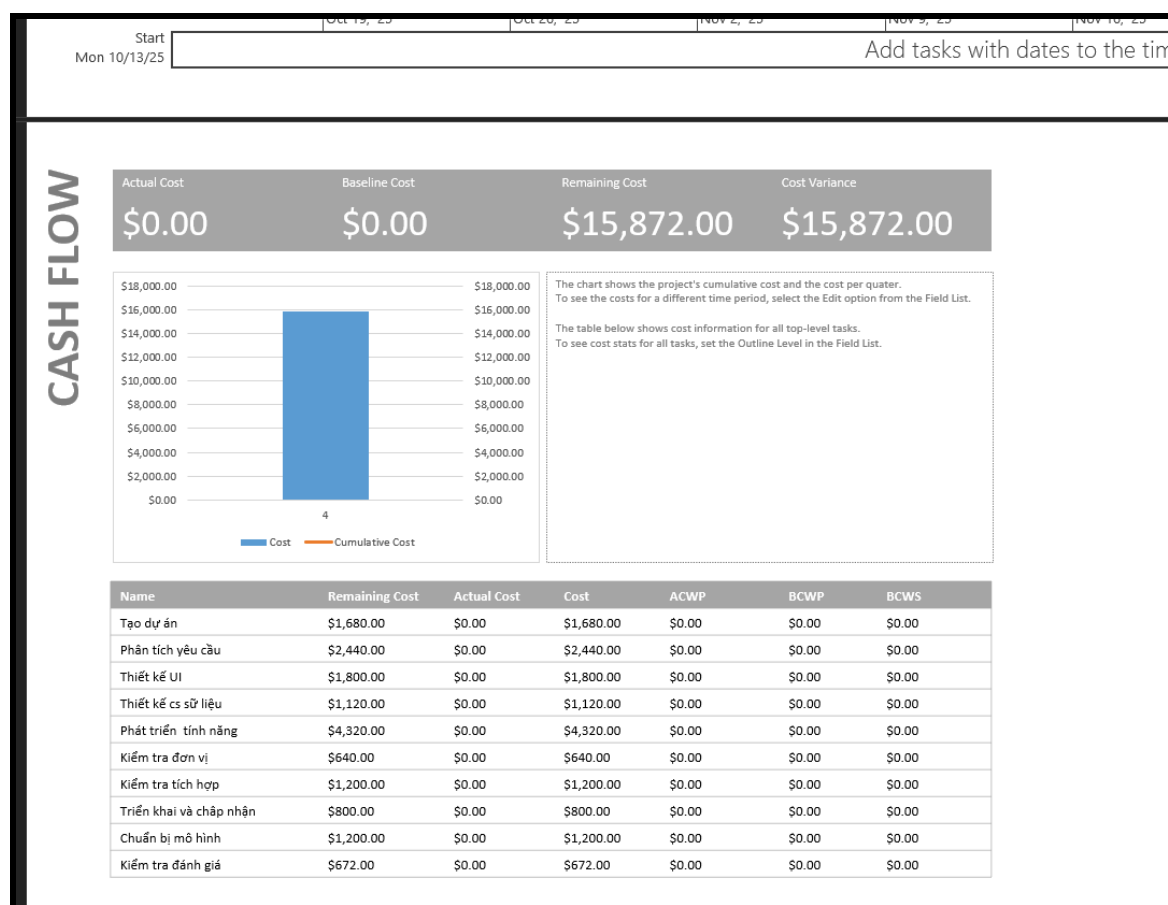


- Report → Costs → Task Cost Overview để xem chi phí theo từng công việc.

TASK COST OVERVIEW


COST STATUS

Cost status for top-level tasks.

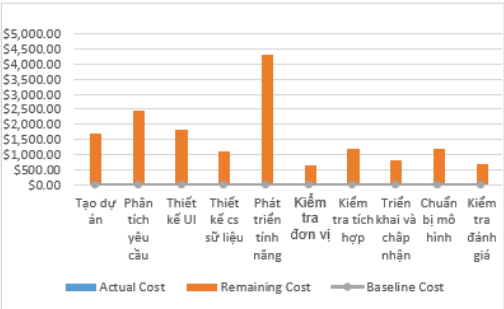

COST DISTRIBUTION

How costs are spread out amongst tasks based on their status.



COST DETAILS

Cost details for all top-level tasks.

Name	Fixed Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Tạo dự án	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
Phân tích yêu cầu	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00
Thiết kế UI	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
Thiết kế cs sử liệu	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
Phát triển tính năng	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
Kiểm tra đơn vị	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
Kiểm tra tích hợp	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
Triển khai và chấp nhận	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
Chuẩn bị mô hình	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
Kiểm tra đánh giá	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00

V. Thiết lập Baseline và theo dõi tiến độ

1) Set Baseline: Project → Set Baseline → Set Baseline → Entire Project → OK

Set Baseline

☒ Set baseline

Baseline

☐ Set interim plan

Copy: Scheduled Start/Finish

Into: Start1/Finish1

For:

☒ Entire project

☐ Selected tasks

Roll up baselines:

☐ To all summary tasks

☐ From subtasks into selected summary task(s)

Set as Default

Help OK Cancel

2) Cập nhật tiến độ: trong cột % Complete nhập các giá trị (ví dụ: 100, 80, 60, 50, 10...).

Task Mode	Task Name	% Complete	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
✓	Tạo dự án	100%	7 days	Mon 10/13/25	Tue 10/21/25		Khánh
✓	Phân tích yêu cầu	100%	6 days	Wed 10/22/25	Wed 10/29/25	1	Khánh,Yên
	Thiết kế UI	55%	4.5 days	Thu 10/30/25	Wed 11/5/25	2	Học,Hung
	Thiết kế cs sử liệu	35%	5 days	Wed 11/5/25	Wed 11/12/25	3	Hung
	Phát triển tính năng	25%	10 days	Wed 11/12/25	Wed 11/26/25	4	Hung,Huy
	Kiểm tra đơn vị	30%	4 days	Wed 11/26/25	Tue 12/2/25	5	Thọ
	Kiểm tra tích hợp	40%	3 days	Tue 12/2/25	Fri 12/5/25	6	Khánh,Thọ
	Triển khai và chấp nhận	10%	2 days	Fri 12/5/25	Tue 12/9/25	7	Khánh,Thọ
	Chuẩn bị mô hình	5%	3 days	Tue 12/9/25	Fri 12/12/25	8	Học,Hung
	Kiểm tra đánh giá	0%	3 days	Fri 12/12/25	Wed 12/17/25	9	Hung

November 2025

13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24


Khánh

Khánh,Yên

Học,Hung

Hung

3) So sánh với kế hoạch ban đầu: View → Tracking Gantt (thanh baseline màu xám dưới thanh tiến độ).

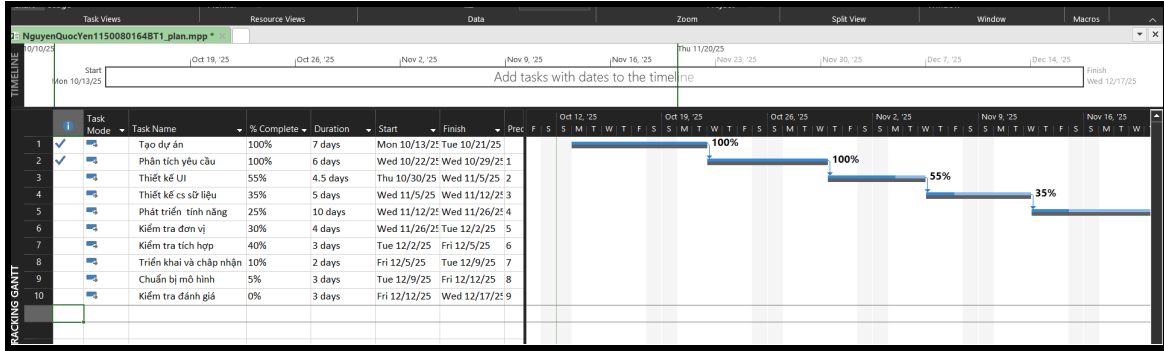

4) Đánh giá: nếu thanh thực tế dài hơn baseline → chậm tiến độ; ngắn hơn → sớm; trùng → đúng tiến độ.

VI. Báo cáo tài chính sau khi dự án kết thúc

- Khi tất cả % Complete = 100%, vào Report → Costs → Cost Overview để chụp số liệu tổng: Total/Actual/Remaining Cost.

