

Nguyễn Quốc Yên

1150080164


Lớp 11cnpm2

## Bài Tập 1

### I. Chuẩn bị dữ liệu (Excel để nhập vào MS Project)

### II. Tạo kế hoạch trong Microsoft Project

File → New → Blank Project. Đặt Project Start Date (Project → Project Information) = 01/04/2025.

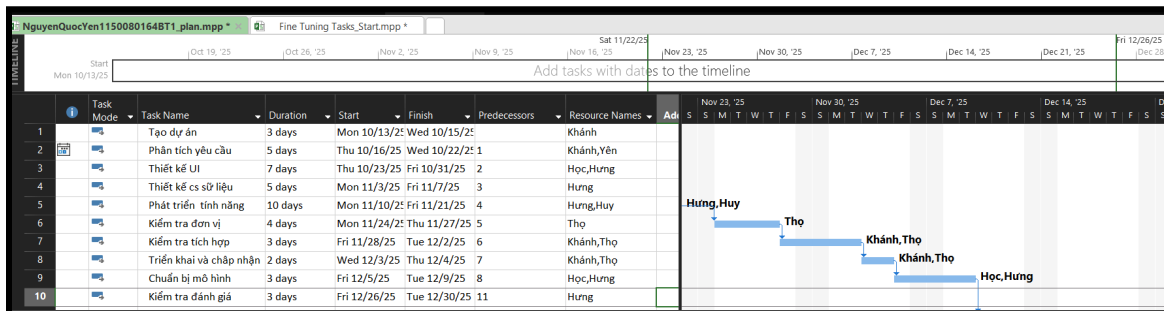

### III. Kiểm tra sự quá tải tài nguyên và cân bằng (Resource Leveling)

#### A. Kiểm tra quá tải:

- View → Resource Sheet: nếu có biểu tượng người đỏ → tài nguyên bị quá tải.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |  |   |  |      |            |           |        |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|---|--|------|------------|-----------|--------|----------|----------|--|
| <div> <div> </div> <div> Resource Sheet Tools </div> <div> NguyenQuocYen1150080164BT1_plan - Project Professional </div> </div> <div> File Task Resource Report Project View Office Tab Help Resource Sheet Format Tell me what you want to do </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |  |   |  |      |            |           |        |          |          |  |
| TIMELINE                                                                                                                                                                                                                                              | <div> <div> </div> <div> NguyenQuocYen1150080164BT1_plan * </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |  |   |  |      |            |           |        |          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <div> <div> Today </div> <div> Start Sun 10/12/25 </div> <div> Mon Oct 13 </div> <div> Tue Oct 14 </div> <div> Wed Oct 15 </div> <div> Thu Oct 16 </div> <div> Fri Oct 17 </div> <div> Sat Oct 18 </div> <div> Sun Oct 19 </div> <div> Mon Oct 20 </div> </div> <div> Add tasks with dates to the timeline </div> |            |      |  |   |  |      |            |           |        |          |          |  |
| SOURCE SHEET                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Khánh      | Work |  | K |  | 100% | \$30.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yên        | Work |  | Y |  | 100% | \$25.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Học        | Work |  | H |  | 100% | \$22.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hưng       | Work |  | H |  | 100% | \$28.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Huy        | Work |  | H |  | 100% | \$26.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thọ        | Work |  | T |  | 100% | \$20.00/hr | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Khánh; Yên | Work |  | K |  | 100% | \$0.00/hr  | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Học; Hưng  | Work |  | H |  | 100% | \$0.00/hr  | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hưng; Huy  | Work |  | H |  | 100% | \$0.00/hr  | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thọ; Khánh | Work |  | T |  | 100% | \$0.00/hr  | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Khánh; Thọ | Work |  | K |  | 100% | \$0.00/hr  | \$0.00/hr | \$0.00 | Prorated | Standard |  |

(Hình không quá tải)

- View → Resource Usage: chọn tài nguyên bị đỏ để xem ngày/giờ vượt quá 8h/ngày.

B. Cân bằng thủ công:

- Dời lịch các task trùng ngày sang ngày kế tiếp (chuyển song song → tuần tự).
- Hoặc giảm Work/Duration từng task (ví dụ từ 8h → 4h trong các ngày trùng).
- Hoặc Split Task để phân chia khối lượng ra nhiều ngày.

C. Cân bằng tự động:


- Resource → Leveling Options → Level All → OK.

## IV. Kiểm tra chi phí (Costs)

- View → Resource Usage: thêm cột Cost hoặc xem tổng ở cuối từng tài nguyên.

|   |  | Resource Name      | Work    | Cost       | Ac | Details | S | Oct 26, '25 |    |    |    |    |    |   |
|---|--|--------------------|---------|------------|----|---------|---|-------------|----|----|----|----|----|---|
|   |  |                    |         |            |    |         | S | S           | M  | T  | W  | T  | F  | S |
| 1 |  | Khánh              | 144 hrs | \$4,320.00 |    | Work    |   |             | 8h | 8h | 8h |    |    |   |
|   |  | Tạo dự án          | 56 hrs  | \$1,680.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Phân tích yêu cầu  | 48 hrs  | \$1,440.00 |    | Work    |   |             | 8h | 8h | 8h |    |    |   |
|   |  | Kiểm tra tích hợp  | 24 hrs  | \$720.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Triển khai và ch   | 16 hrs  | \$480.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
| 2 |  | Yên                | 40 hrs  | \$1,000.00 |    | Work    |   |             | 8h | 8h |    |    |    |   |
|   |  | Phân tích yêu cầu  | 40 hrs  | \$1,000.00 |    | Work    |   |             | 8h | 8h |    |    |    |   |
| 3 |  | Học                | 60 hrs  | \$1,320.00 |    | Work    |   |             |    |    |    | 8h | 8h |   |
|   |  | Thiết kế UI        | 36 hrs  | \$792.00   |    | Work    |   |             |    |    |    | 8h | 8h |   |
|   |  | Chuẩn bị mô hình   | 24 hrs  | \$528.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
| 4 |  | Hưng               | 204 hrs | \$5,712.00 |    | Work    |   |             |    |    |    | 8h | 8h |   |
|   |  | Thiết kế UI        | 36 hrs  | \$1,008.00 |    | Work    |   |             |    |    |    | 8h | 8h |   |
|   |  | Thiết kế cs sử liệ | 40 hrs  | \$1,120.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Phát triển tính n  | 80 hrs  | \$2,240.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Chuẩn bị mô hình   | 24 hrs  | \$672.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Kiểm tra đánh gi   | 24 hrs  | \$672.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
| 5 |  | Huy                | 80 hrs  | \$2,080.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Phát triển tính n  | 80 hrs  | \$2,080.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
| 6 |  | Thọ                | 72 hrs  | \$1,440.00 |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Kiểm tra đơn vị    | 32 hrs  | \$640.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Kiểm tra tích hợp  | 24 hrs  | \$480.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  | Triển khai và ch   | 16 hrs  | \$320.00   |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |
|   |  |                    |         |            |    | Work    |   |             |    |    |    |    |    |   |

- Report → Costs → Cost Overview (nếu không thấy, chọn More Reports... → tab Costs → Cost Overview).
- Report → Costs → Cash Flow để xem dòng tiền.

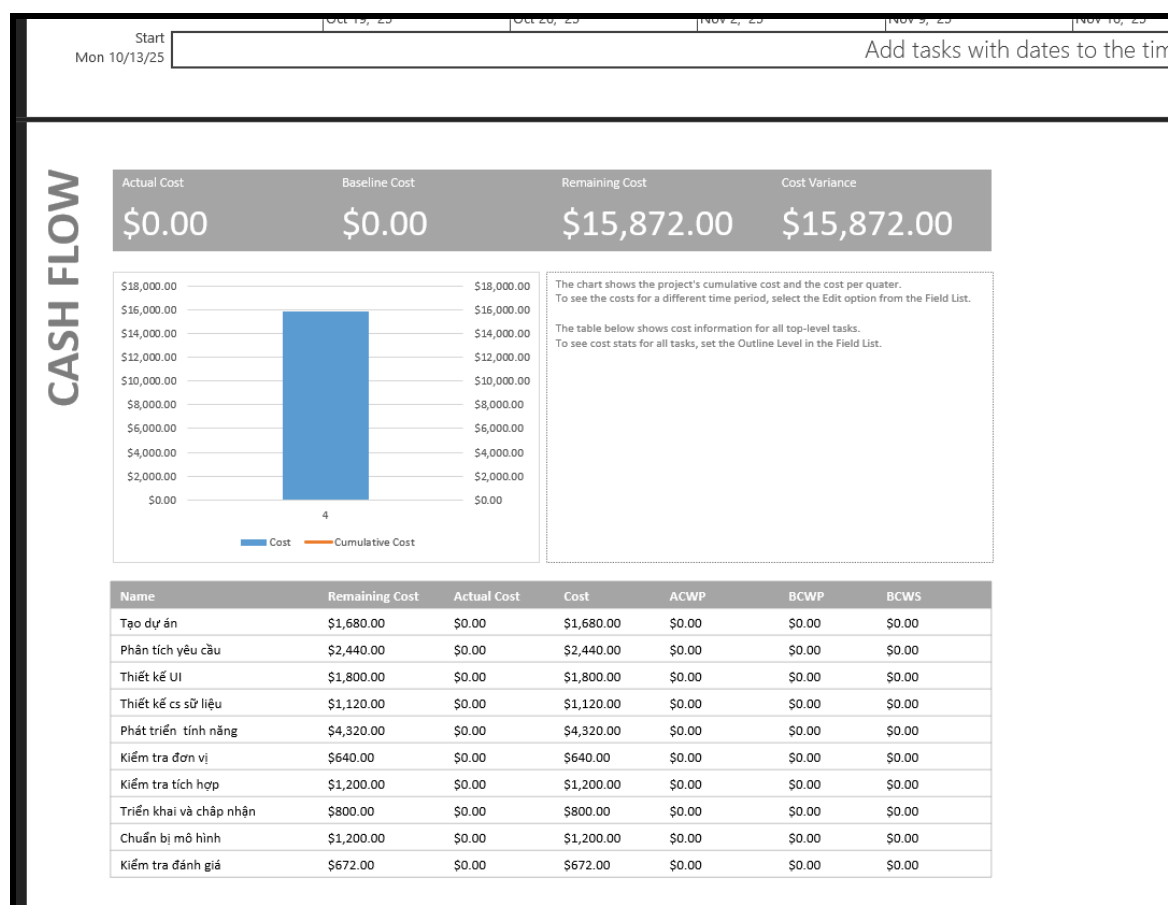


- Report → Costs → Task Cost Overview để xem chi phí theo từng công việc.

# TASK COST OVERVIEW


## COST STATUS

Cost status for top-level tasks.

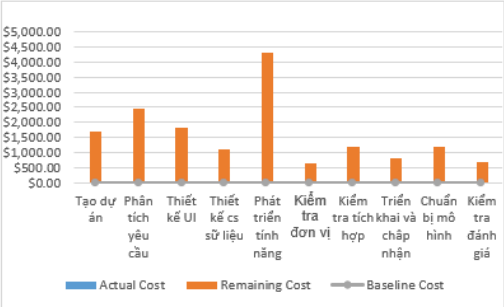

## COST DISTRIBUTION

How costs are spread out amongst tasks based on their status.

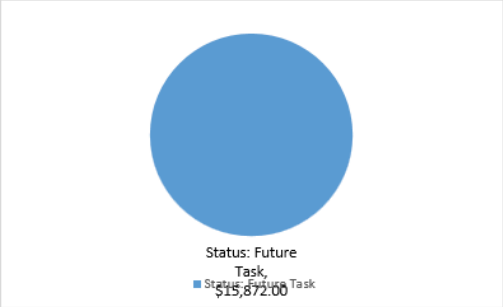


## COST DETAILS

Cost details for all top-level tasks.

| Name                    | Fixed Cost | Actual Cost | Remaining Cost | Cost       | Baseline Cost | Cost Variance |
|-------------------------|------------|-------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Tạo dự án               | \$0.00     | \$0.00      | \$1,680.00     | \$1,680.00 | \$0.00        | \$1,680.00    |
| Phân tích yêu cầu       | \$0.00     | \$0.00      | \$2,440.00     | \$2,440.00 | \$0.00        | \$2,440.00    |
| Thiết kế UI             | \$0.00     | \$0.00      | \$1,800.00     | \$1,800.00 | \$0.00        | \$1,800.00    |
| Thiết kế cs sử liệu     | \$0.00     | \$0.00      | \$1,120.00     | \$1,120.00 | \$0.00        | \$1,120.00    |
| Phát triển tính năng    | \$0.00     | \$0.00      | \$4,320.00     | \$4,320.00 | \$0.00        | \$4,320.00    |
| Kiểm tra đơn vị         | \$0.00     | \$0.00      | \$640.00       | \$640.00   | \$0.00        | \$640.00      |
| Kiểm tra tích hợp       | \$0.00     | \$0.00      | \$1,200.00     | \$1,200.00 | \$0.00        | \$1,200.00    |
| Triển khai và chấp nhận | \$0.00     | \$0.00      | \$800.00       | \$800.00   | \$0.00        | \$800.00      |
| Chuẩn bị mô hình        | \$0.00     | \$0.00      | \$1,200.00     | \$1,200.00 | \$0.00        | \$1,200.00    |
| Kiểm tra đánh giá       | \$0.00     | \$0.00      | \$672.00       | \$672.00   | \$0.00        | \$672.00      |

## V. Thiết lập Baseline và theo dõi tiến độ


1) Set Baseline: Project → Set Baseline → Set Baseline → Entire Project → OK

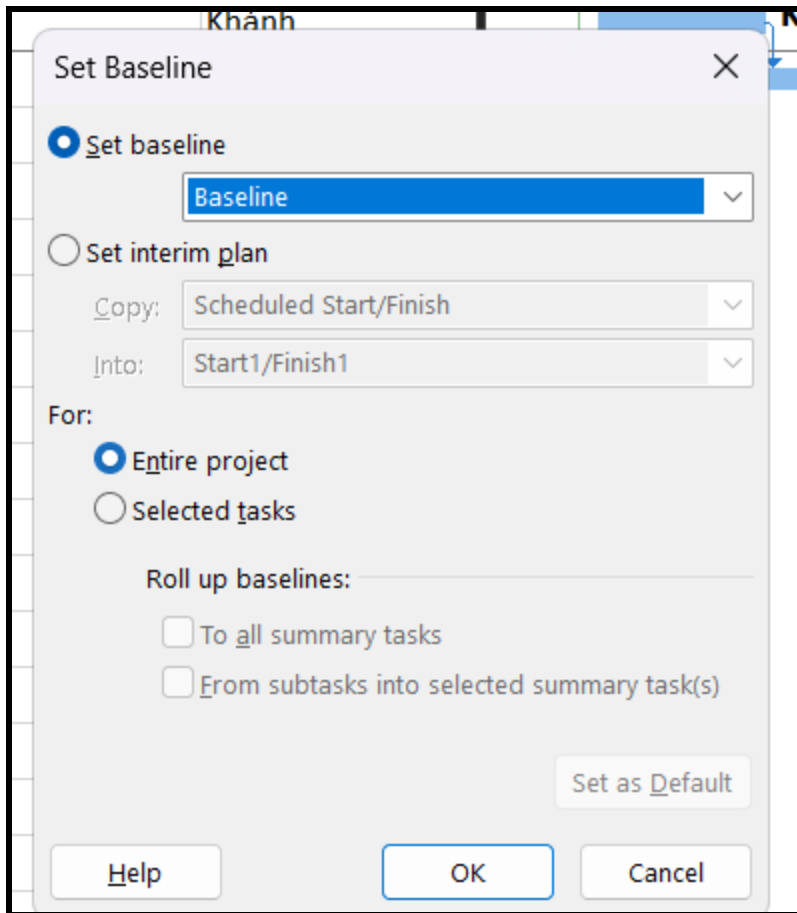

2) Cập nhật tiến độ: trong cột % Complete nhập các giá trị (ví dụ: 100, 80, 60, 50, 10...).

| Task Mode | Task Name               | % Complete | Duration | Start        | Finish       | Predecessors | Resource Names |
|-----------|-------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| ✓         | Tạo dự án               | 100%       | 7 days   | Mon 10/13/25 | Tue 10/21/25 |              | Khánh          |
| ✓         | Phân tích yêu cầu       | 100%       | 6 days   | Wed 10/22/25 | Wed 10/29/25 | 1            | Khánh,Yên      |
|           | Thiết kế UI             | 55%        | 4.5 days | Thu 10/30/25 | Wed 11/5/25  | 2            | Học,Hưng       |
|           | Thiết kế cs sử liệu     | 35%        | 5 days   | Wed 11/5/25  | Wed 11/12/25 | 3            | Hưng           |
|           | Phát triển tính năng    | 25%        | 10 days  | Wed 11/12/25 | Wed 11/26/25 | 4            | Hưng,Huy       |
|           | Kiểm tra đơn vị         | 30%        | 4 days   | Wed 11/26/25 | Tue 12/2/25  | 5            | Thọ            |
|           | Kiểm tra tích hợp       | 40%        | 3 days   | Tue 12/2/25  | Fri 12/5/25  | 6            | Khánh,Thọ      |
|           | Triển khai và chấp nhận | 10%        | 2 days   | Fri 12/5/25  | Tue 12/9/25  | 7            | Khánh,Thọ      |
|           | Chuẩn bị mô hình        | 5%         | 3 days   | Tue 12/9/25  | Fri 12/12/25 | 8            | Học,Hưng       |
|           | Kiểm tra đánh giá       | 0%         | 3 days   | Fri 12/12/25 | Wed 12/17/25 | 9            | Hưng           |

3) So sánh với kế hoạch ban đầu: View → Tracking Gantt (thanh baseline màu xám dưới thanh tiến độ).

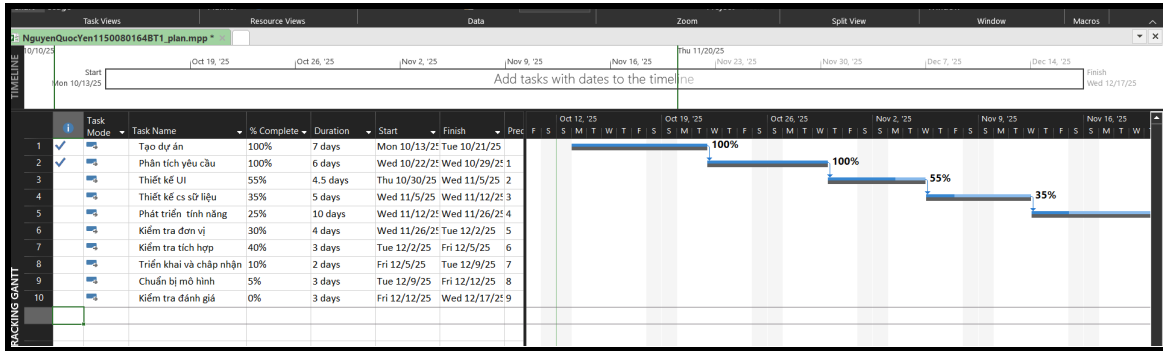

4) Đánh giá: nếu thanh thực tế dài hơn baseline → chậm tiến độ; ngắn hơn → sớm; trùng → đúng tiến độ.

## VI. Báo cáo tài chính sau khi dự án kết thúc

• Khi tất cả % Complete = 100%, vào Report → Costs → Cost Overview để chụp số liệu tổng: Total/Actual/Remaining Cost.

